

韓國漢城華僑中學

重整足球場

人工草皮工程照片

2026.04.06-8.19

## 簡介過程

4 月 6 日舉行動土典禮，4 月 20 日契約；5 月 6 日正式動工。

埋設排水管自第二大樓至校門口，自高而低處，水管由 30 公分、40 公分、60 公分至 80 公分。另於球場中間埋設較細水管連至四周排水管再連至校外下水道。

最外側排水管、跑道邊及球場四周排水管(水泥)

另於排水管中間設置蓄水池，以便蓄水淨水後排出。

第一大樓下濟水排出重埋設擋土牆邊排水管

由於學校操場，校門邊較低，第二棟大樓邊較高，因此需墊高靠校門邊土地。整地後鋪小石子以便排水、再鋪細沙

校門口排水管及蓄水池，整個排水積中於此，再連至大馬路之排水管

整理跑道、步道及停車場、跑道地基工程；跑道鋪設橡皮碎片後油漆、經過兩次油漆後，以樹酯混合橡膠顆粒噴鋪跑道(PU)

球場鋪設排水版，為防止摔傷及減少草皮過度擠壓而斷裂，在排水版上鋪設避震墊並用鋼釘及黏步固定。

鋪設人工草皮，草皮是一片一片的，在兩片草皮中間用黏膠黏住以免翹起，另中場及球門前中場及球門前白線並非劃的而是鋪設的。

停車場及大門口鋪設柏油、司令台前在鋪磚之前先鋪沙子

球場中場及球門白線鋪好後車子來回撒了多次沙子，據告這是為草皮打地基，防止草皮位移及膨脹，每平方公尺要 20-25 公斤，之後，再鋪橡皮沙粒

於球場邊打印學校名字(沒法打印中文)

鋪車道及人道的磚

油漆教學大樓(免費)

架設球門後札欄及網子、測試球場反彈係數


劃、油漆羽毛球場

劃停車位線跟羽毛球場線

架設球門

8 月 19 日完工



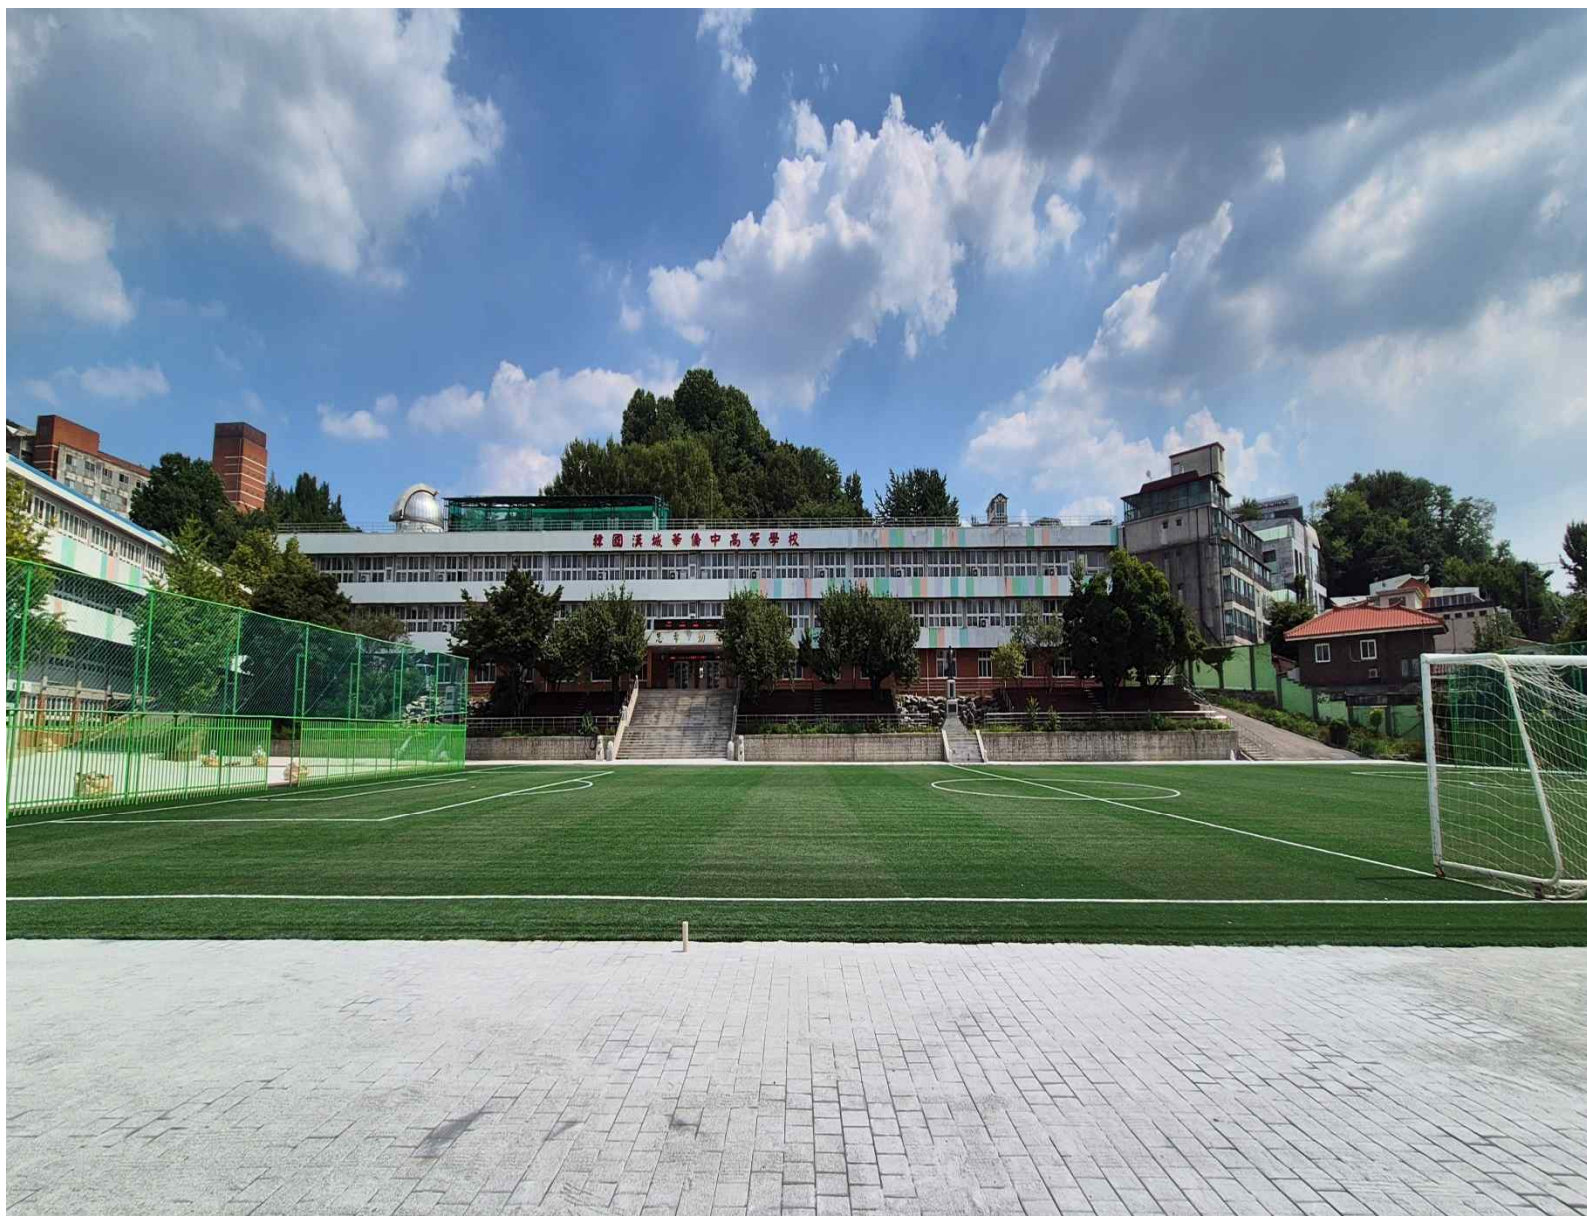



3月22日召開理事會決議接受區廳補助，並於4月6日舉行動土典禮，有代表部丘高偉代表、西大門李性憲區廳長、漢城華僑協會李中漢會長、漢城華僑小學李忠憲理事長、本校譚紹榮理事長及多位僑領，本校全體師生參加。









4 月底進行草廠劃圖工程，於 5 月 6 日正式動工，5 月 12 日西大門區廳劃撥工程補助款 4 億 5 千萬元。







埋設排水管自第二大樓至校門口，自高而低處，水管由 30 公分、40 公分、60 公分至 80 公分。另於球場中間埋設較細水管連至四周排水管再連至校外下水道。



另於排水管中間設置蓄水池，以便蓄水淨水後排出。



最外側排水管





校門口排水管及蓄水池，整個排水積中於此，再連至大馬路之排水管







跑道邊及球場四周排水管









重埋設擋土牆邊排水管以便排洩第一大樓下積水





譚紹榮理事長、李中漢副理事長、梁兆林常務顧問、于植盛校長及黃群老師勘查工程現場





整理跑道、步道及停車場










## 跑道地基工程



由於學校操場，校門邊較低，第二棟大樓邊較高，因此需墊高靠校門邊土地。



整地後鋪小石子以便排水

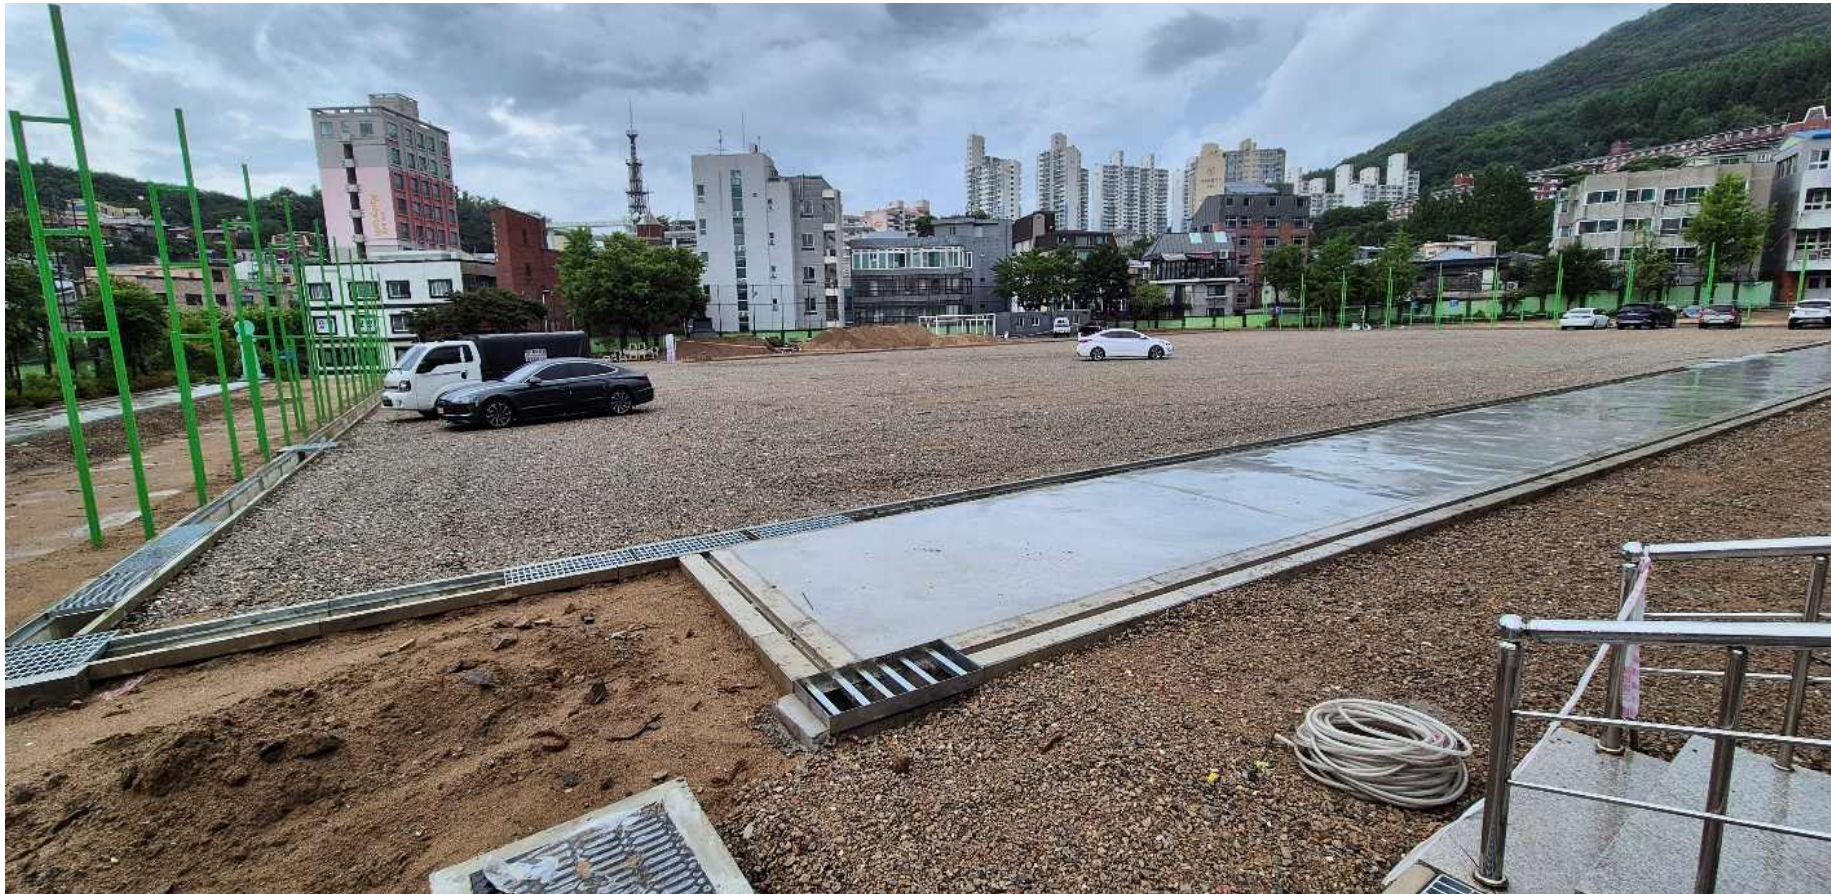

再鋪細沙






跑道鋪設橡皮碎片後油漆





使用高壓水槍清洗排水管後加蓋蓋子防止垃圾流入

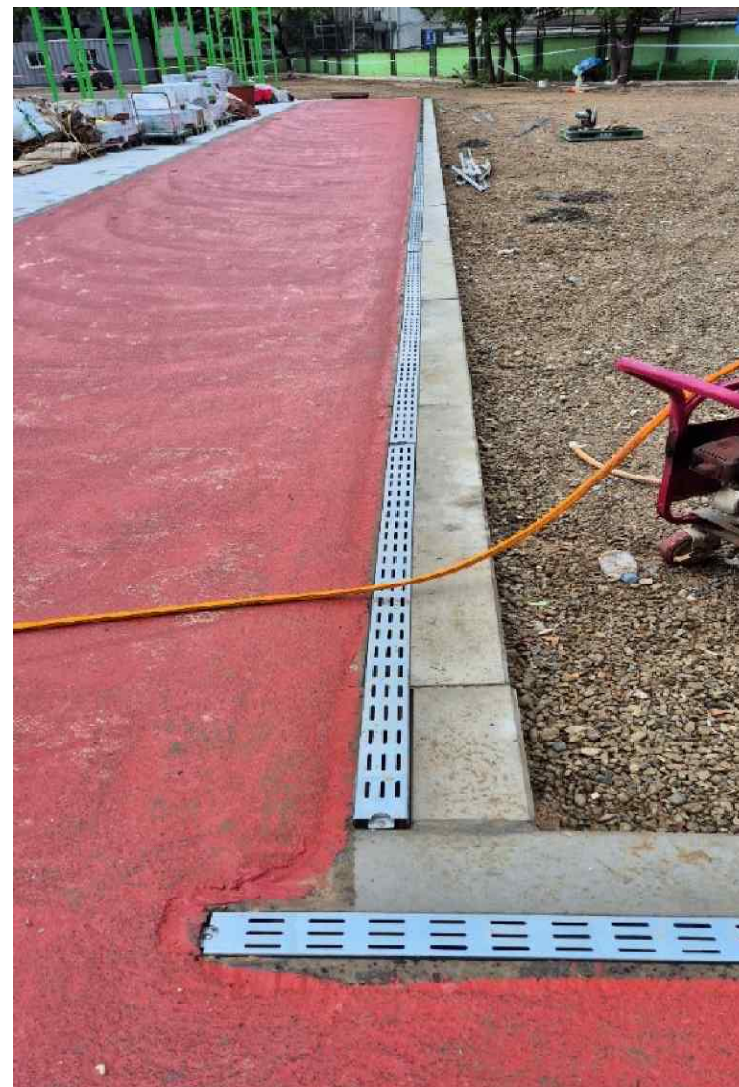

## 二度油漆



經過兩次油漆後，以樹酯混合橡膠顆粒噴鋪跑道




球場鋪設排水版，跑道劃線



防止摔傷及減少草皮過度擠壓而斷裂，在排水版上鋪設避震墊並用鋼釘及黏步固定。





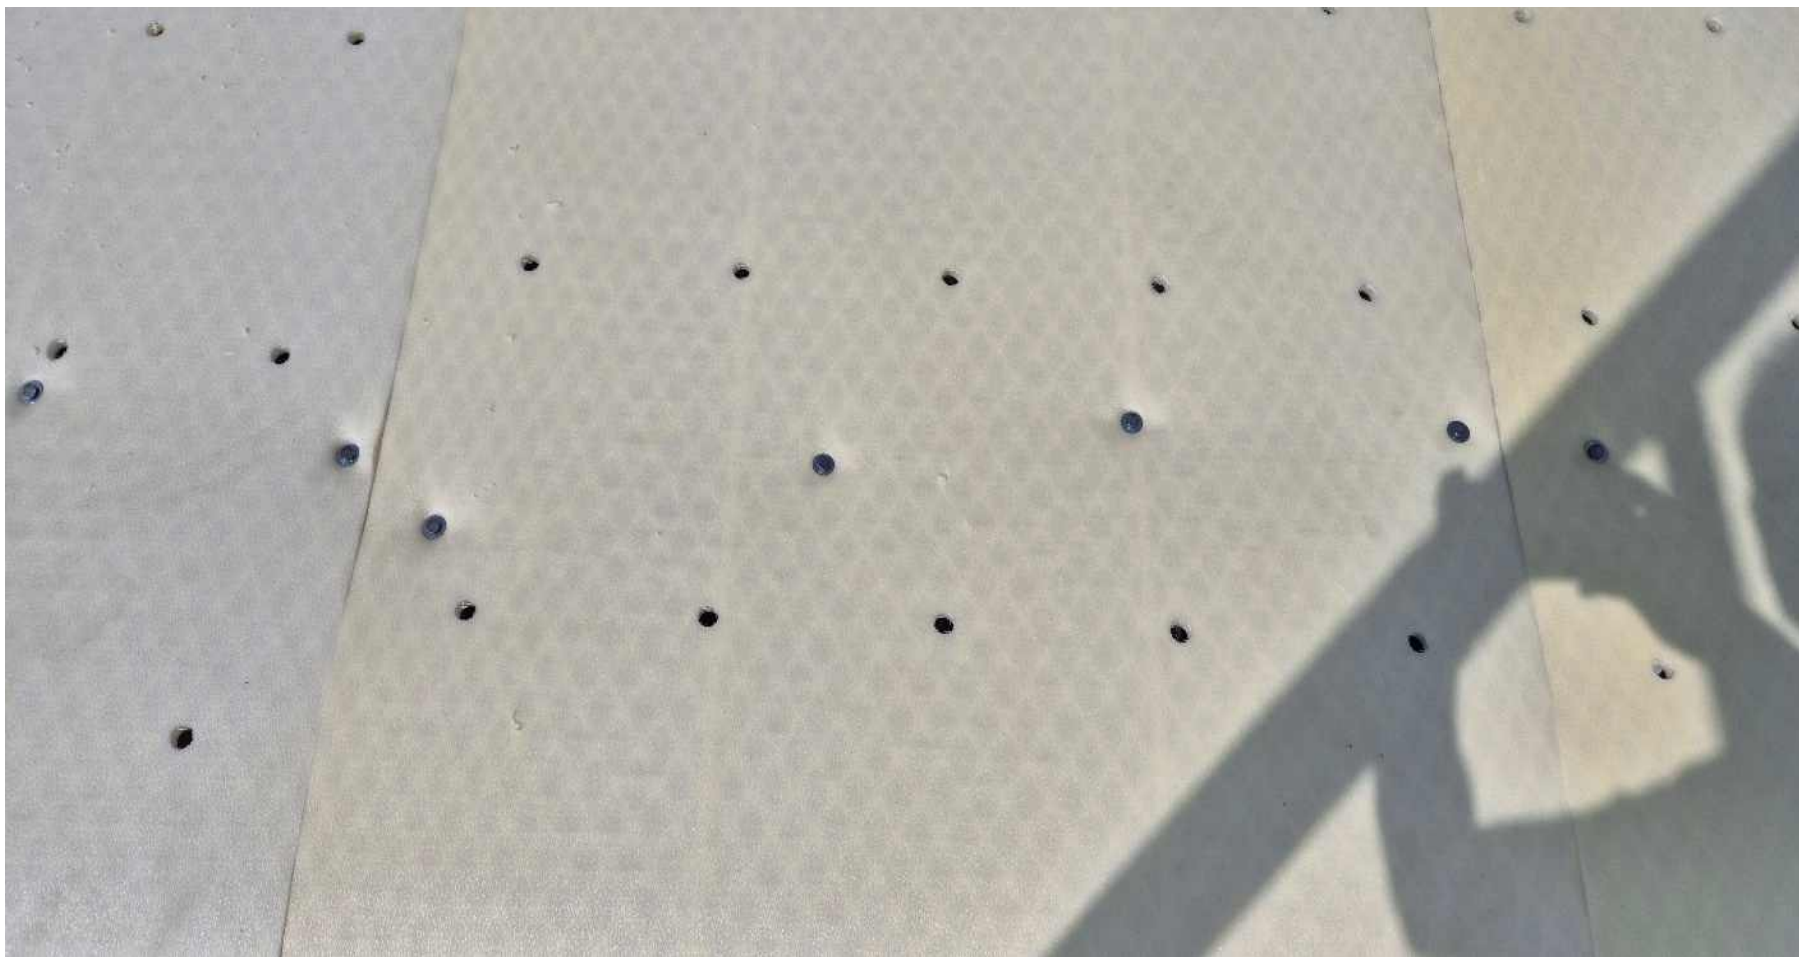

鋪設人工草皮，草皮是一片一片的，在兩片草皮中間用黏膠黏住以免翹起，  
另中場及球門前中場及球門前白線並非劃的而是鋪設的。









停車場及大門口鋪設柏油








司令台前在鋪磚之前先鋪沙子



球場中場及球門白線鋪好後車子來回撒了多次沙子  
(石英砂，左邊的車在撒沙子，右邊的車在整理)，  
據告這是為草皮打地基，防止草皮位移及膨脹，每平方公尺要 20-25 公斤



鋪橡皮沙粒

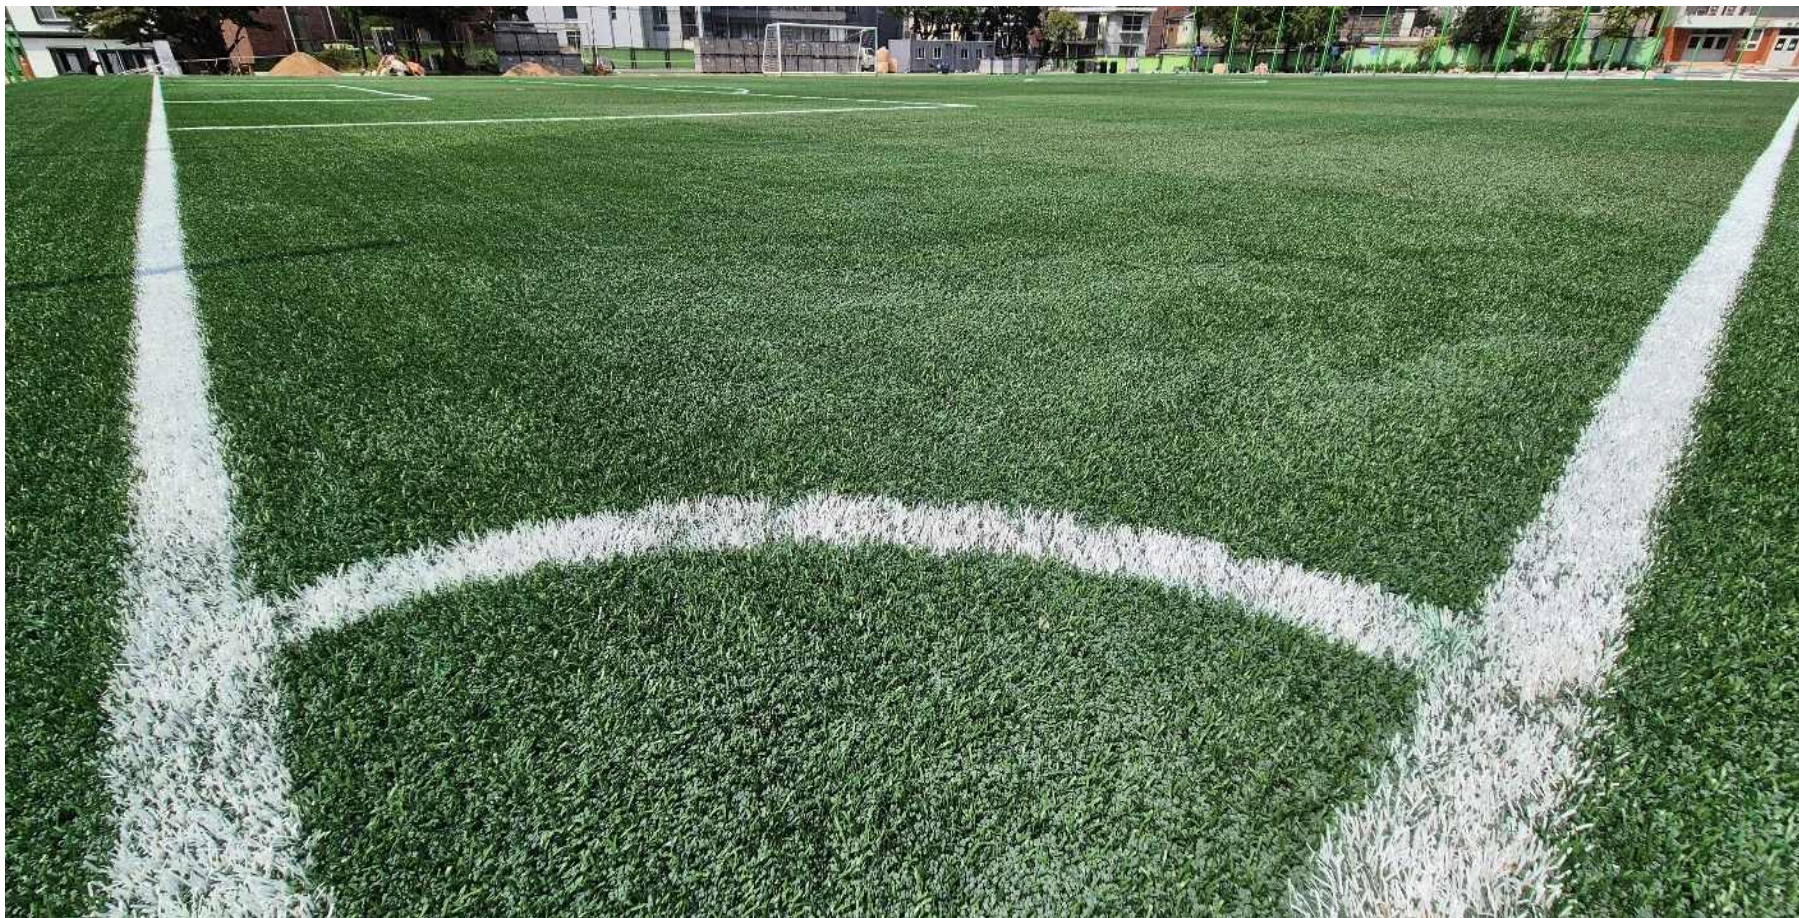





足球場邊打印學校名字(沒法打印中文)




## 鋪車道及人道的磚

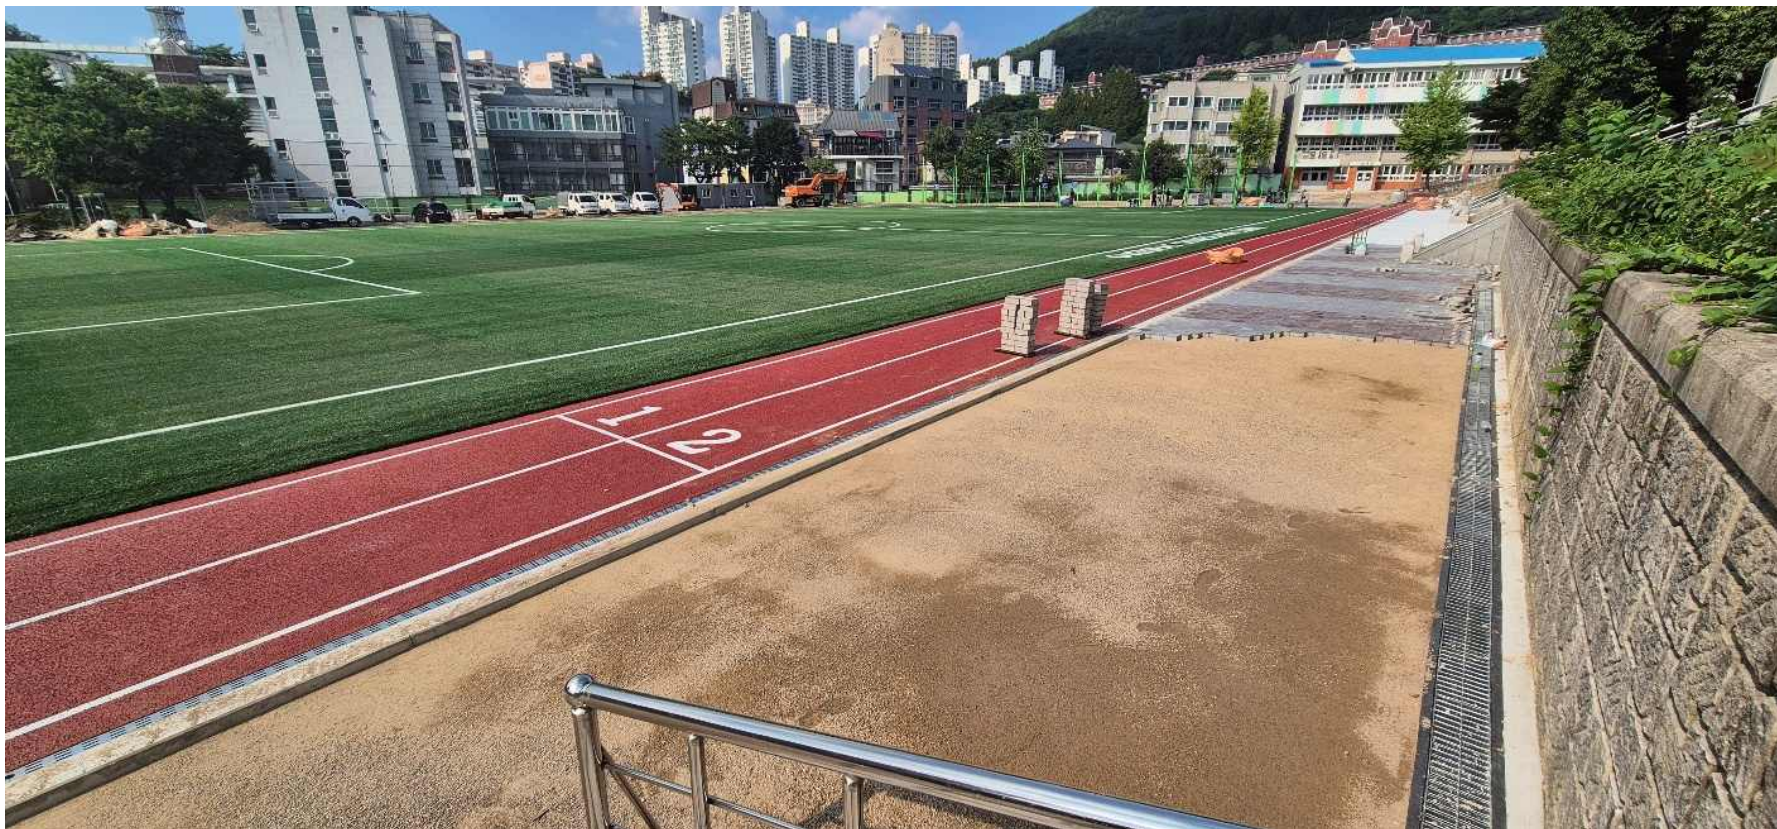



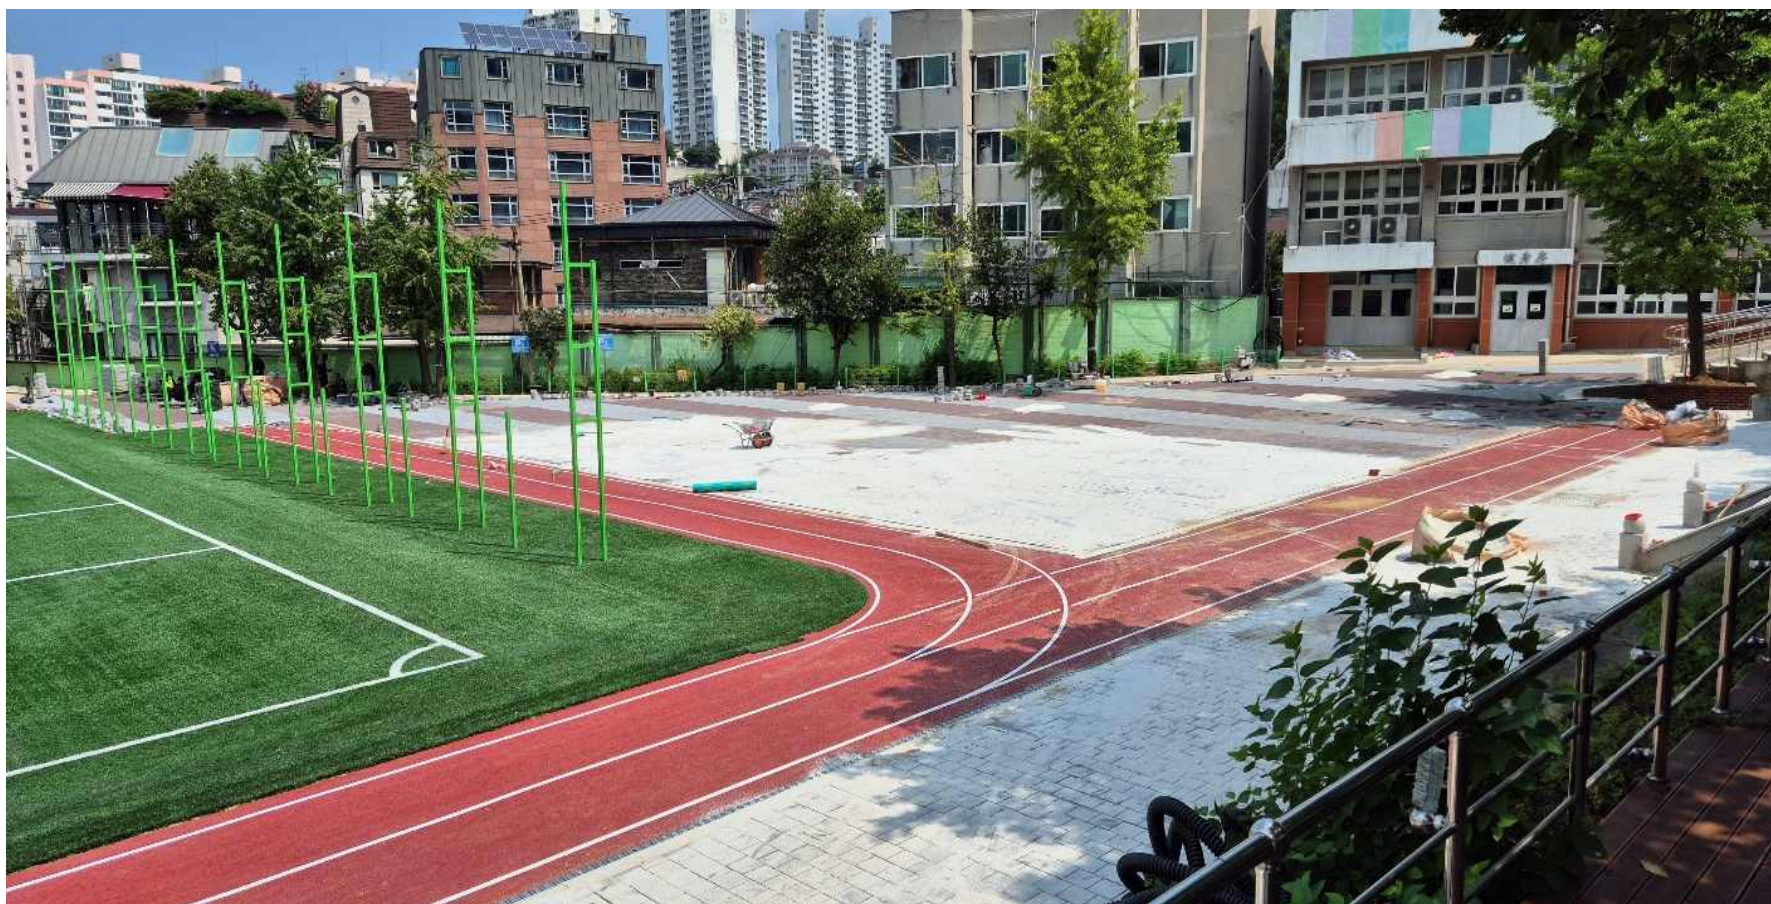

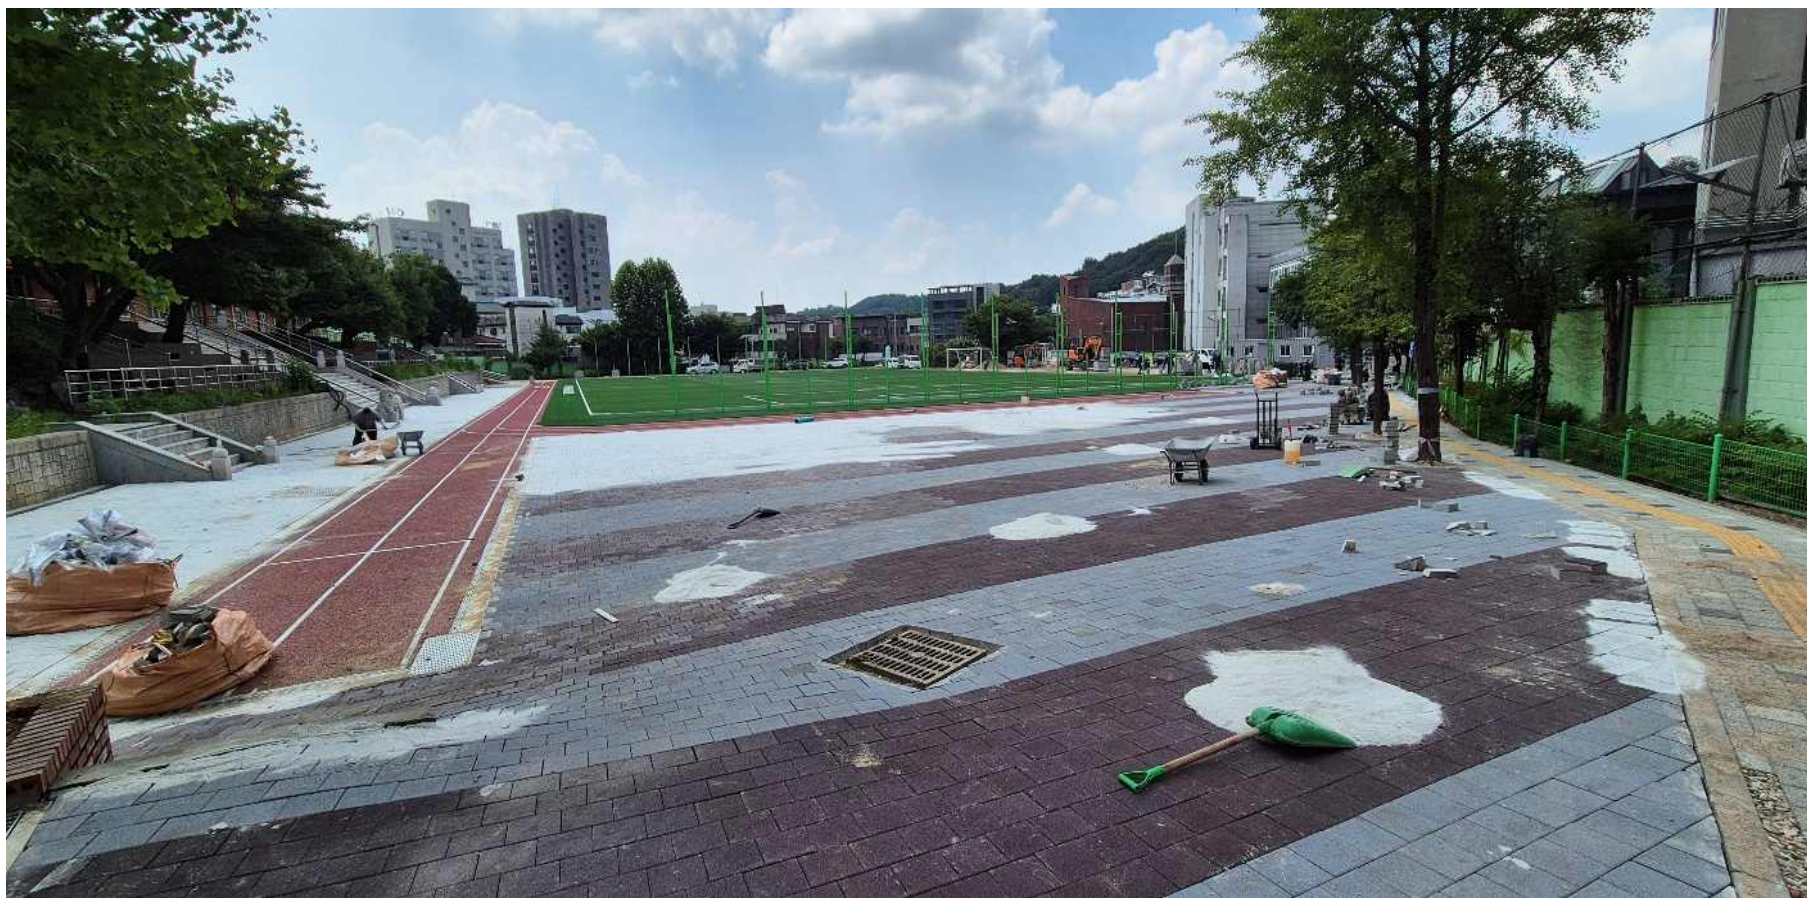









油漆教學大樓








架設球門後札欄及網子





## 測試球場反彈係數

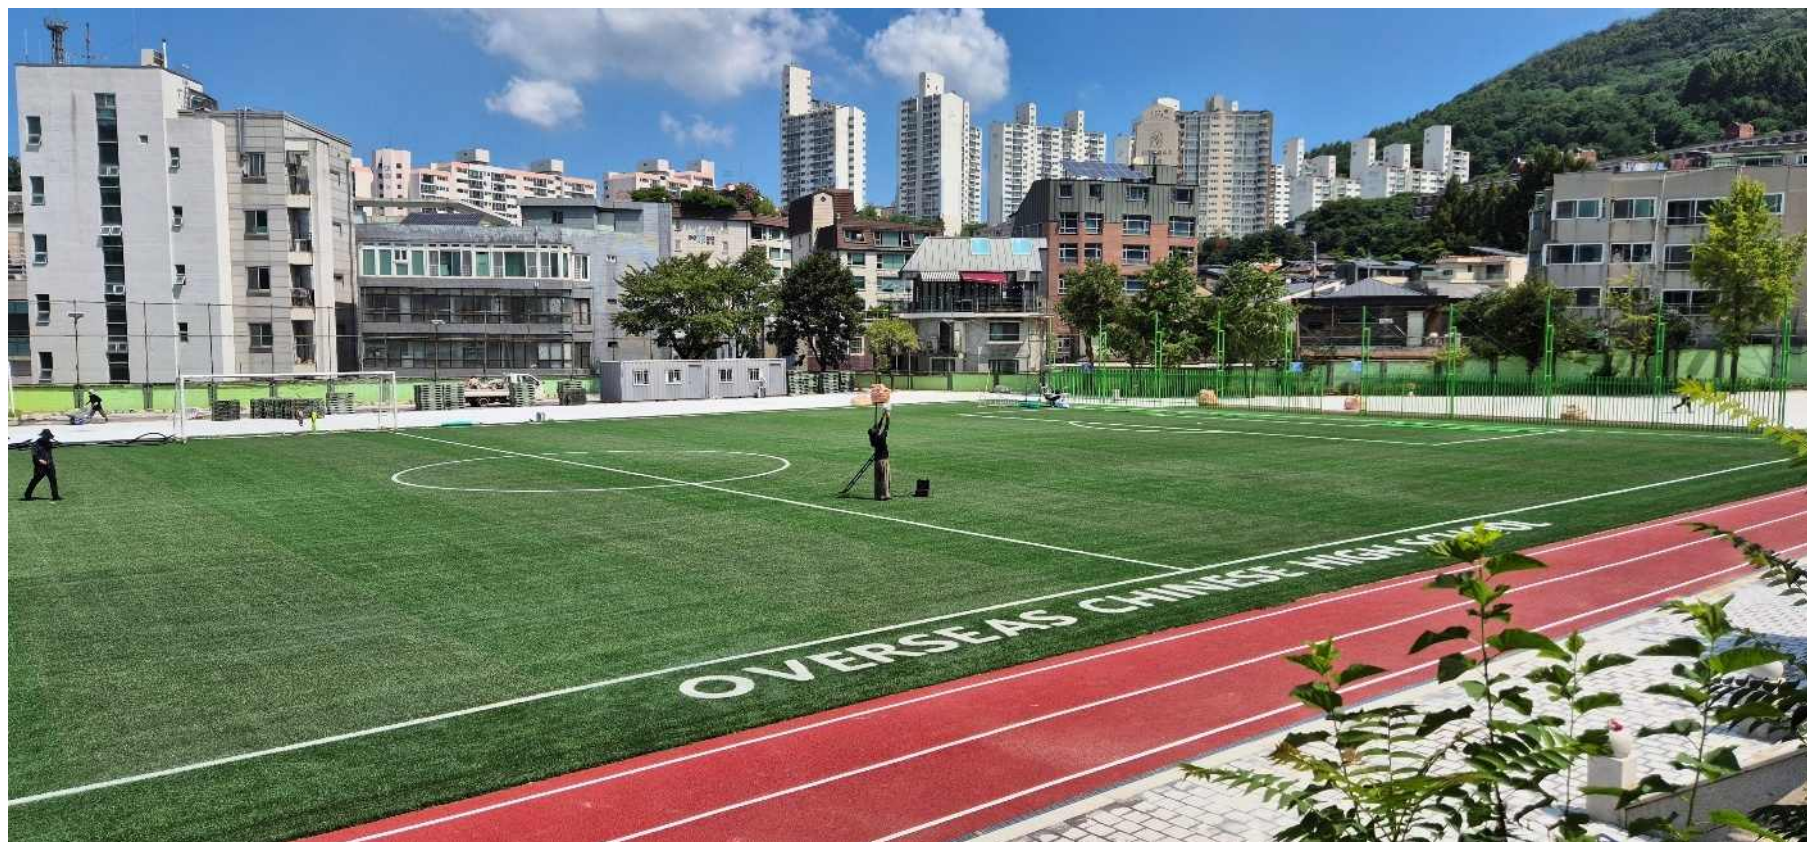



劃、油漆羽毛球場





羽毛球場



## 無障礙停車位



## 停車位



停車位

